



COMUNE DI ORISTANO

Provincia di Oristano

“Interventi di riqualificazione urbana via Aristana e via Arborea”
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

PROGETTO DEFINITIVO

Committente: Comune di Oristano Piazza E. d'Arborea, 44 - 09170 Oristano	Il Dirigente Settore Sviluppo del Territorio: Ing. Giuseppe Pinna Responsabile del procedimento: Ing. Yuri Iannuzzi
--	--

Progettisti:

arch. Alberto A. Loche

.....

ing. Emanuele Tendas

.....

ing. Carlo Pisanu

.....

ing. Annalaura Putzu

.....

Consulenti:

dott. agr. Marco M. A. Pessini

Collaboratori:

arch. Mattia Firinu

oggetto dell'elaborato		
Cronoprogramma		
progetto:	scala grafica	elaborato n. A09
file:	aggiornamento:	
	

note / visti / estremi approvazione

.....

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. **Oristano Est**

Interventi di riqualificazione urbana via Aristana e via Arborea


Cronoprogramma delle Fasi di Realizzazione																						
Fase	Anno 2017							Anno 2018												Anno 2019		
Mese	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Redazione e Approvazione Progetto Definitivo	X	X																				
Redazione e Approvazione Progetto Esecutivo			X	X	X																	
Avvio Procedura di Gara						X	X															
Aggiudicazione Lavori								X	X													
Esecuzione Lavori										X	X	X	X	X	X	X	X					
Collaudo e piena Funzionalità dell'Opera																		X				
Avanzamento Spesa																						

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 01/03/2018 a 07/04/2018	da 08/04/2018 a 24/05/2018	da 25/05/2018 a 30/07/2018	da 31/07/2018 a 04/09/2018	da 05/09/2018 a 26/10/2018	
A - VIA ARISTANA	€ 189.319,50	€ 59.726,40	€ 66.070,77	€ 63.522,33			
A1 - SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	(€ 59.726,40)	(€ 59.726,40)					
A2 - MASSICCIATE, VESPAI, MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	(€ 91.482,60)		(€ 66.070,77)	(€ 25.411,83)			
A3 - SISTEMAZIONE A VERDE	(€ 27.410,50)			(€ 27.410,50)			
A4 - ARREDO URBANO	(€ 10.700,00)			(€ 10.700,00)			
B - VIA ARBOREA	€ 149.381,13			€ 29.383,07	€ 29.024,37	€ 90.973,69	
B1 - SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	(€ 37.218,55)			(€ 29.383,07)	(€ 7.835,48)		
B2 - MASSICCIATE, VESPAI, MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	(€ 77.692,58)				(€ 21.188,89)	(€ 56.503,69)	
B3 - SISTEMAZIONE A VERDE	(€ 26.370,00)					(€ 26.370,00)	
B4 - ARREDO URBANO	(€ 8.100,00)					(€ 8.100,00)	
C - IMPIANTI	€ 121.799,37	€ 33.902,33	€ 25.071,57	€ 577,30	€ 62.248,17		
- VIA ARISTANA	(€ 58.973,90)	(€ 33.902,33)	(€ 25.071,57)				
C1 - IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO, SCARICO ACQUE METEORICHE	(€ 16.400,00)	(€ 12.615,38)	(€ 3.784,62)				
C2 - IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	(€ 42.573,90)	(€ 21.286,95)	(€ 21.286,95)				
- VIA ARBOREA	(€ 62.825,47)			(€ 577,30)	(€ 62.248,17)		
C3 - IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO, SCARICO ACQUE METEORICHE	(€ 15.009,87)			(€ 577,30)	(€ 14.432,57)		
C4 - IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	(€ 47.815,60)				(€ 47.815,60)		
IMPORTO		€ 93.628,73	€ 91.142,34	€ 93.482,70	€ 91.272,54	€ 90.973,69	
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 93.628,73	€ 184.771,07	€ 278.253,77	€ 369.526,31	€ 460.500,00	
%		20,33	19,79	20,30	19,82	19,76	
% PROGRESSIVA		20,33	40,12	60,42	80,24	100,00	

PROGRAMMA S.A.L.

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
01/03/2018	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Inizio lavori
07/04/2018	38	38	€ 93.628,74	€ 93.628,74	20,33	Si
24/05/2018	85	47	€ 184.771,07	€ 91.142,33	40,12	Si
30/07/2018	152	67	€ 278.253,76	€ 93.482,69	60,42	Si
04/09/2018	188	36	€ 369.526,30	€ 91.272,54	80,24	Si
26/10/2018	240	52	€ 460.500,00	€ 90.973,70	100,00	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

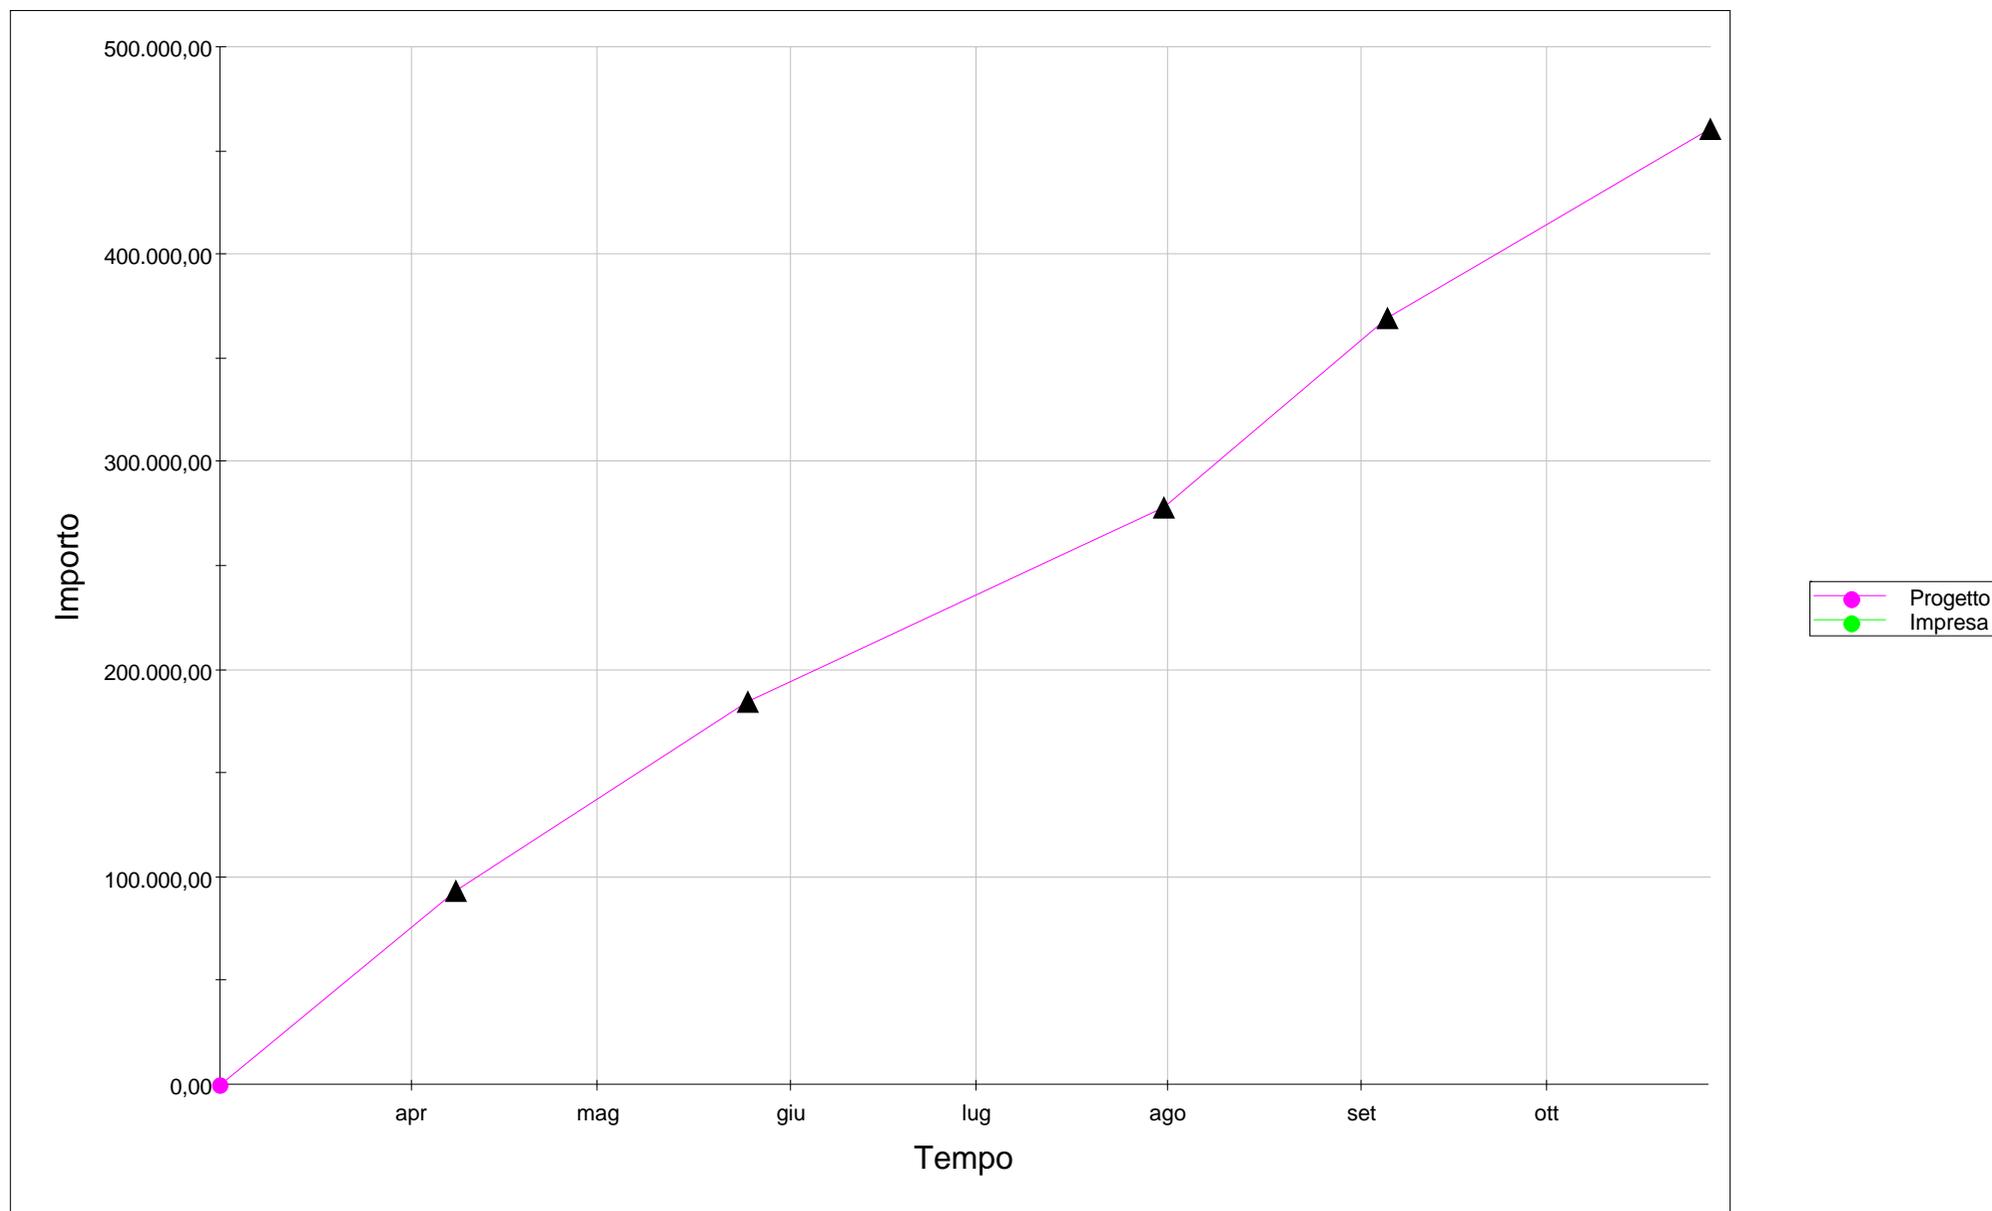

LEGENDA: ● punto che delimita periodi a media di produzione costante
 ▲ Stato Avanzamento Lavori programmato
